

Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера

Задача: 1 Составить список из 7-10 ключевых вопросов к заказчику и стейкхолдерам

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
1	Как измерить успех проекта? Сколько ресурсов (время/сотрудники) уходит на подготовку и сверку данных, сколько негативных моментов (риск дефицита, количество списаний и просрочек) было за последний год? Какие целевые значения ожидаются после внедрения?	Владелец бизнеса(управляющий) + администратор склада	Зафиксировать базовые значения и целевые показатели по сокращению ручной работы, дефициту и списанию, определить бизнес-критерии приемки MVP	Расхождение ожиданий и результата MVP; нет оценки ROI
2	Какие источники данных сейчас используются (1С, CRM, Excel, почта, поставщики и др.), кто владеет каждым, как часто данные обновляются?	Администратор склада + разработчики	Составить карту источников, добиться большей точности и автоматизации в ТО ВЕ	Конфликт данных источников; неверная оценка интеграции; автоматизация не тех шагов
3	По каким правилам принимается решение о закупке? Как планируется запас, как рассчитывается минимальная партия, сроки поставки, лимиты и условия поставщиков? Какие есть установленные правила работы?	Администратор склада	Формализовать логику Понимание реальных правил используемых в компании	Не понимание реальных условий / требований работы существующих на текущий момент в компании. Несоответствие ожиданий заказчика с полученным результатом в MVP
4	Как работает контроль срока годности? Что делают с такими товарами (скидка, возврат поставщику, списание), как учитываются списания в бюджете?	Администратор склада + финансовый менеджер	Задать правила и пороги для сценария «товары с истекающим сроком» и связать риск списания с расчетом закупки и бюджета	Пропущенные просрочки; заказ товара, который не успеют использовать; неучтенные списания в бюджете
5	Как формируется бюджет? Какие параметры (валюта, НДС, прогноз цен, скидки,	Финансовый менеджер	Определить формулы бюджета и объяснения причин отклонений (цены, спрос, расход),	Расхождение с фин. отчетностью и реальными показателями

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
	условия оплаты и т. д.) требуются, кто их утверждает? Есть ли эталонные значения / ориентиры?		получить эталон для проверки 95%	
6	Какие объекты и категории входят в MVP? Какие товары критичны, какой горизонт планирования для разных видов закупок.	Владелец бизнеса(управляю щий) + администратор склада	Выбрать тестовую область MVP и приоритетные товары, на которых можно проверить метрики	Неверный горизонт планирования при каталогизации товаров/объектов
7	Насколько самостоятелен ИИ? Кто принимает финальное решение, какие роли и права нужны, как сохраняется история расчетов и ручных правок, какие форматы экспорта требуются?	Владелец бизнеса(управляю щий) + финансовый менеджер + администратор склада	Определить уровень автономности, роли	Размывание границ действия/самостоят ельности ИИ, проблемы в безопасности, нарушение внутреннего контроля, снижение релевантности данных / отчетов.
8	Какие технические ограничения есть? Какие требования СБ? Допустима ли передача данных во внешние источники? Какие технологии можем использовать с точки зрения СБ	Команда разработчиков + владелец бизнеса (управляющий)	Выбрать оптимальный способ / технологии для решения задачи, соответствующий критериям безопасности и техническим возможностям.	Блокировка со стороны СБ; утечка данных.
9	Как должна вести себя система, если данных недостаточно (например, новый товар без истории, нестабильные поставки, пропуски)? Показывать ли уведомление, предупреждение, или не давать рекомендацию вовсе?	Администратор склада + разработчики + владелец бизнеса(управляю щий)	Задать корректное поведение системы при недостаточности данных	Ошибки в рекомендациях, прогнозировании
10	Как в дальнейшем (после MVP) планируется развивать решение?	Владелец бизнеса(управляю щий) + команда разработчиков	Понять дорожную карту, чтобы архитектурные решения MVP не пришлось переделывать при расширении	Невозможность развития MVP в дальнейшем

Задача 2: Описание бизнес-процесса «Контроль сроков годности и списание партии» в формате BPMN

Комментарии к BPMN:


Синий цвет: система;

Желтый цвет: администратор склада;

Фиолетово-розовый: финансовый менеджер.

Комментарии к самому процессу:

1. Срок истек: выбор пути — уведомление и попытка реализации товара или же сразу в списание;
2. Возможность реализации до истечения: если попытка удачная, то процесс завершается без списания;
3. Сумма списания превышает лимит: нужен ли фин.менеджер для согласования или автоматическое списание;
4. При отказе — процесс возвращается к администратору склада на пересмотр.

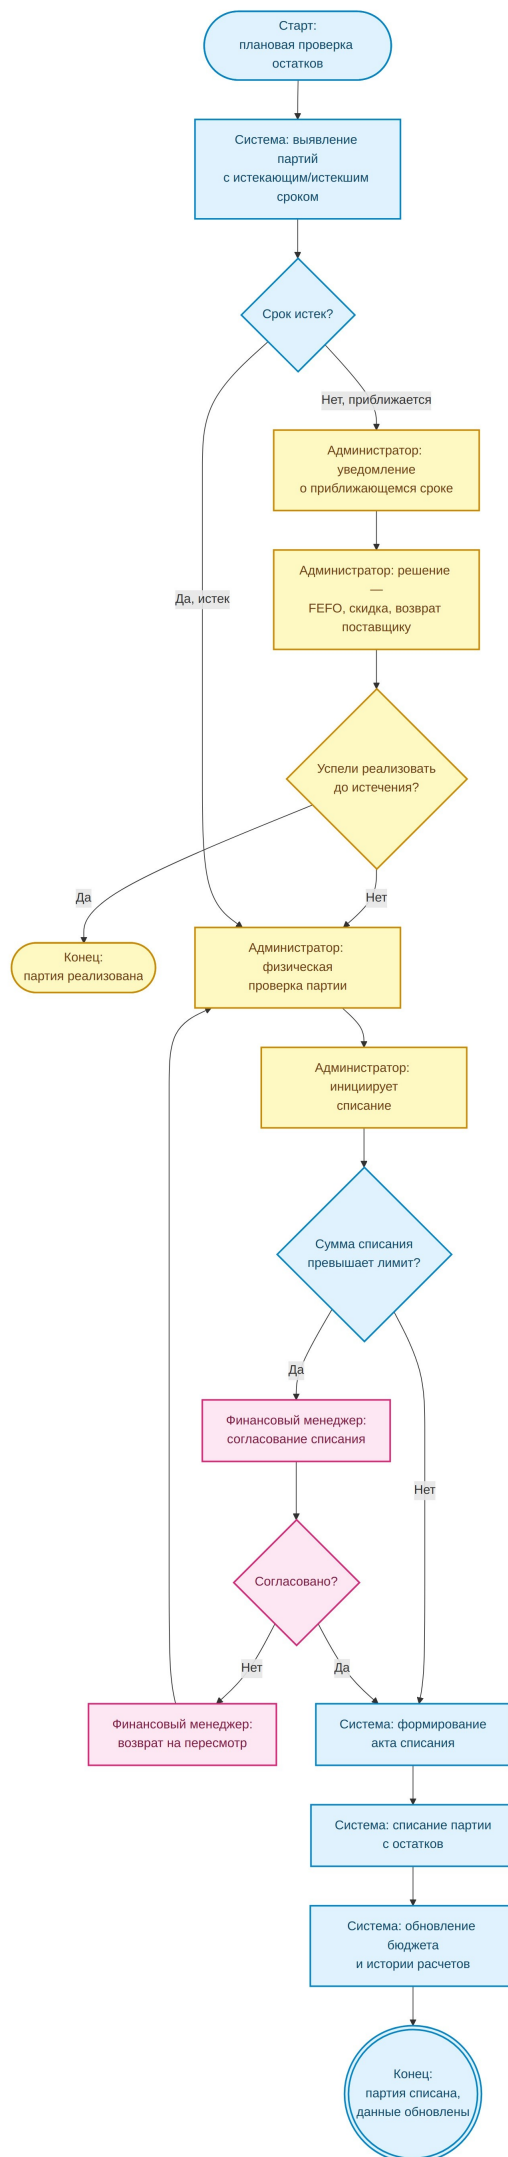

Задача 3: Дорожная карта пилота

Дорожная карта пилота: 8 недель

№	Веха	Срок	Что делаем
M1	Уточнение требований и границ пилота	Нед. 1 –2	Финализация вопросов к стейкхолдерам, выбор тестового объекта (склада/категории), определение эталонов для метрик, формирование карты источников данных, обращение к службе безопасности (СБ) для уточнения возможностей/границ использования данных.
M2	Аудит и подготовка данных	Нед. 2 –3	Доступ к источникам (остатки, движение, цены, поставки), оценка качества данных, очистка/нормализация под пилотную категорию, уточнение требований от СБ, получение доступов/указаний от СБ
M3	Разработка MVP	Нед. 3 –5	Модуль + базовый UI под тестовые сценарии
M4	Внутреннее тестирование	Нед. 5 –6	Тестирование, выявление ошибок, проверка на соответствие данных. Передача СБ на проверку.
M5	Пилотный запуск с тестовыми пользователями	Нед. 6 –7	Проверка системы на реальных данных согласованных заказчиком и СБ: сбор обратной связи от тестовых пользователей.
M6	Обратная связь и доработка	Нед. 7 –8	Получение обратной связи от основных стейкхолдеров, тестовых пользователей, СБ. Корректировка, исправление ошибок. Дополнительное внутреннее тестирование.
M7	Сдача проекта, итоговая оценка	Нед. 8	Сверка метрик с целевыми значениями, отчет заказчику, предложение о масштабировании

Критерии готовности

Веха	Критерий перехода к следующему этапу
M1 → M2	Собраны ответы на ключевые вопросы стейкхолдерам; согласована тестовая категория / данные; согласованы требования от СБ
M2 → M3	Переданы данные за нужный период; доступы от СБ получены;
M3 → M4	Система работает с 1-2 пилотным сценарием на тестовых данных, экспорт работает; прописаны первичные тесты; создан первичный UI; пройдена первичная проверка СБ
M4 → M5	Выполняется условие $\geq 95\%$. Внесены корректировки по замечаниям/предложениям UI; Исправлены ошибки выявленные в тестах; дополнительная проверка СБ — пройдена; Система показывает стабильную работу.
M5 →	Минимум 2 недели реального использования: получена обратная связь от

Веха	Критерий перехода к следующему этапу
М6	администратора склада, фин.менеджера, тестовых пользователей, СБ. Проведены дополнительные тесты, внесены корректировки.
М6 → М7	Критичные замечания закрыты; метрики пересчитаны на реальных данных
Финал	MVP – готов. Владелец бизнеса — получил отчет. Обратная связь. Предложения по расширению MVP.

Кто вовлечен:

Роль	Зона ответственности в пилоте
Владелец бизнеса	Заказчик, приоритеты MVP, финальное решение — подтверждение соответствия MVP требованиям и согласование дальнейшего развития.
Администратор склада	Экспертиза / Данные по правилам закупок и FEFO, тестирование, обратная связь на М5–М6
Финансовый менеджер	Экспертиза / данные бюджета, согласование лимитов, проверка метрики «корректность бюджета»
Служба безопасности (СБ)	Доступы / границы использования / данные разрешенные к допуску / проверка на утечки / безопасность
Команда разработчиков	Консультация / Интеграция данных, разработка модуля расчетов и UI, тестирование
ВА/РМ	Координация, сбор требований, контроль критериев готовности, отчетность

Возможные риски:

- 1) Замедление работы по причине: требований СБ, долгой / неполной передачи данных от фин.менеджера и администратора склада, что может привести к снижению релевантности тестирования, ошибках в логике расчетов, определений некорректных границ ограничений.
- 2) Ошибки в расчете сроков годности для разных категорий товаров: если данные не будут предоставлены в достаточном объеме, какие-то виды могут не учитываться, что приведет к ошибке в алгоритме, точности желаемых данных. Как следствие — большие временные издержки на корректировки, дополнительное тестирование, риск не успеть в дедлайн;
- 3) Дизайн интерфейса: в команде нет дизайнера, фронт делает его на свое усмотрение / вкус. Дизайн может не понравится заказчику / команде заказчика. Решение — заранее опросить заказчика / команду заказчика о предпочтительном дизайне.
- 4) Галлюцинации в LLM: решение — дополнительные проверки данных / полей, валидация по ряду параметров.

Задача 4: Контрольные сценарии и методы приемки:

Сценарий 1: вероятность дефицита в ближайшие две недели

Что измеряем	Товары с риском дефицита; доля реального дефицита, доля ложных срабатываний
Как измеряем	Берем N соответствующих периодов из истории. Анализируем возникший дефицит. Проверяем фактические данные. Используем алгоритм прогнозирования
На каких данных	Предоставленных заказчиком: остатки, расход, поставки по тестовой категории.
Порог приемки	> 95%. Пропущенный дефицит — критическая ошибка.

Сценарий 2: план закупок

Что измеряем	Расчет объема закупок и стоимости — метрика 1 из требований
Как измеряем	Расчетный объем/стоимость с фактическими данными. Считаем долю позиций, попавших в согласованный допуск отклонения
На каких данных	Закупки/цены за выбранный период по тестовой категории с разбивкой по временным периодам/товарам
Порог приемки	>95%

Сценарий 3: товары с истекающим сроком годности / риском списания

Что измеряем	Партии фактически списанные / ушедшие под списание — метрика напрямую связана с корректностью остатка и движения товара
Как измеряем	Фактические списания за выбранный период. Проверка: показала бы система эти партии заранее (за выбранное количество дней до истечения) и совпадает ли расчетный остаток с фактическим складским учетом на дату проверки.
На каких данных	Движение по срокам годности и данные актов по списанию за определенный период
Порог приемки	>95%

Сценарий 4: сокращение ручной работы

Что измеряем	Сокращение времени при подготовке закупки / сверки данных
Как измеряем	Затраты при использовании ручного труда / при автоматизации

На каких данных	Реальные задачи / Тестовые задачи: должен быть одинаковый объем данных, тип задач, чтобы сравнение вышло релевантным
Порог приемки	Обсуждается с владельцем бизнеса (заказчиком).

Задача 5: выстраивание процесса работы с заказчиком и командой

С заказчиком: связь (любым удобным заказчику способом) в начале рабочей недели (в понедельник) и в конце (пятница). В понедельник — планы команды на рабочую неделю, вопросы относительно изменений в проекте / возможных корректировок, обратная связь от клиента — что нравится / не нравится в проекте, команде и т.д.

В пятницу — краткие результаты работы, на каком этапе находимся, какие есть успехи, если есть проблемы - как мы можем их решить.

С командой (формат видео-конференции): понедельник — обсуждение хода работы, составление плана задач на неделю, обсуждение проблем, поиск вариантов их решения. Пятница — итоги работы, планы на следующую неделю, обсуждение проблем, поиск вариантов их решения.

Отдельный чат в мессенджере для оперативного обсуждения / уведомления / решения проблем.

Обмен телефонами и электронными почтами — для экстренной связи.

2. Мотивация участия в проекте

1. Хороший опыт, который я могу применить в других видах деятельности или в компании-заказчике, если от нее поступит интересное предложение; работа над бизнес-проектом, в котором ИИ играет важную роль; прокачать навыки работы в команде.
2. С одной стороны — связь между заказчиком (бизнесом) и командой разработки; с другой — координация работы команды для того чтобы она выполнила свою задачу точно в срок.
3. Так как в настоящее время работаю сам на себя, то не более 20-25 часов в неделю. Я, конечно, могу выделить и больше (например, в выходные дни или в случае возникновения какой-либо критической ситуации), но мне хотелось бы придерживаться именно такого графика. Желательный формат — удаленка (привычный для меня формат, работаю в таком режиме уже более 9-ти лет) или гибрид (4 дня удаленка, 1 офис или 3 дня удаленка и 2 офис), но только в Москве.
