


Цифровой помощник тьютора

Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
1	Как оформляется согласие родителей на сбор и обработку данных ребенка, включая передачу данных в LLM? Требуется ли отдельное согласие на обработку персональных данных с учетом текущего законодательства?	Родители + владелец бизнеса/заказчик + разработчики + служба безопасности (СБ)	Понять возможность и юридическое основание для обработки специальной категории персональных данных (здоровье, поведение несовершеннолетнего). Насколько эти данные сохранены. Насколько они соответствуют текущим требованиям законодательства.	Нарушение законодательства о персональных данных, в этом году — серьезные штрафы для юридических лиц; невозможность использования ряда LLM-функций; возможность раскрытия данных; Самый негативный сценарий - блокировка проекта на старте
2	Кто и в каком объеме должен видеть профиль ребенка и наблюдения — тьютор, специалист сопровождения, врач, родитель? Нужны ли разные роли и уровни доступа? Планируется ли разный интерфейс для каждой роли?	Разработчики + заказчик + врачи + родители + СБ	Спроектировать модель доступа (роли, разграничение прав) под разные потребности каждой стороны	Утечка чувствительных данных; доступ не по назначению; перегруженность самой системы / интерфейса; недоверие пользователей к системе
3	По какой методике сейчас фиксируются наблюдения — есть ли утвержденные шкалы/чек-листы (например, по эмоциям, сенсорике)? Если нет, то возможно ли как-то систематизировать / каталогизировать их до старта?	Специалисты сопровождения + разработчики	Возможно ли структурировать ввод (выпадающие списки, шкалы) или нужна обработка свободного текста.	Неверная структура данных; невозможность агрегировать данные и строить динамику
4	ИИ-подсказки — это рекомендация для специалиста или основание для решений о ребенке? Кто принимает финальное решение и кто отвечает, если подсказка окажется ошибочной?	Владелец бизнеса + специалисты сопровождения + врачи	Определить уровень автономности ИИ и цену ошибки для уязвимой группы пользователей	Вредная или неверная рекомендация принимается без проверки; неясная юридическая ответственность

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
5	Как система интерпретирует конфликтующие или противоречивые наблюдения от разных тьюторов/специалистов ? Требуется ли пометка «кто наблюдал» и наглядная демонстрация расхождений?	Заказчик + разработчики	Определить логику агрегации данных от нескольких пользователей. Не потерять субъективность оценки	Ложное впечатление объективности; сглаживание важных расхождений в восприятии поведения ребенка
6	Что делать, если тьютор долго не вносит наблюдения по ребенку? Нужны ли напоминания, возможно ли штрафы за долгое отсутствие активности, изменение статуса профиля?	Заказчик + разработчики	Поведение системы с учетом неполных данных	Из-за неполных данных, может исказиться динамика
7	В каком виде и с какой периодичностью родители могут получать отчеты (PDF, уведомления, рассылки и т.д.)	Заказчик + разработчики	Определить формат и способ вывода данных отчета	Пользователи не получают необходимую полноту информации
8	Как ведет себя система, если ИИ не уверен в подсказке (мало данных о ребенке, новая запись, редкий паттерн поведения)?	Специалисты сопровождения + врачи + разработчики	Задать поведение при недостаточности данных	Некорректные данные; Ошибочные предположения на основании некорректных данных
9	Требуется ли анонимизация данных перед отправкой в LLM?	Разработчики + заказчик + СБ	Выбрать архитектуру ИИ-компонента с учетом требований конфиденциальности	Утечка чувствительных данных; нарушение условий согласия родителей
10	Кто и как проверяет качество и пользу ИИ-подсказок на практике, и что делает команда, если подсказка оказалась неверной или потенциально вредной?	Специалисты сопровождения + врачи + разработчики + СБ	Заложить процесс контроля качества, обратной связи и корректировки модели	Систематические ошибки ИИ остаются незамеченными; снижение доверия команды и риск для ребенка

2) Описание ключевого бизнес-процесса: Сохранение наблюдений в БД и привязка к профилю ребенка

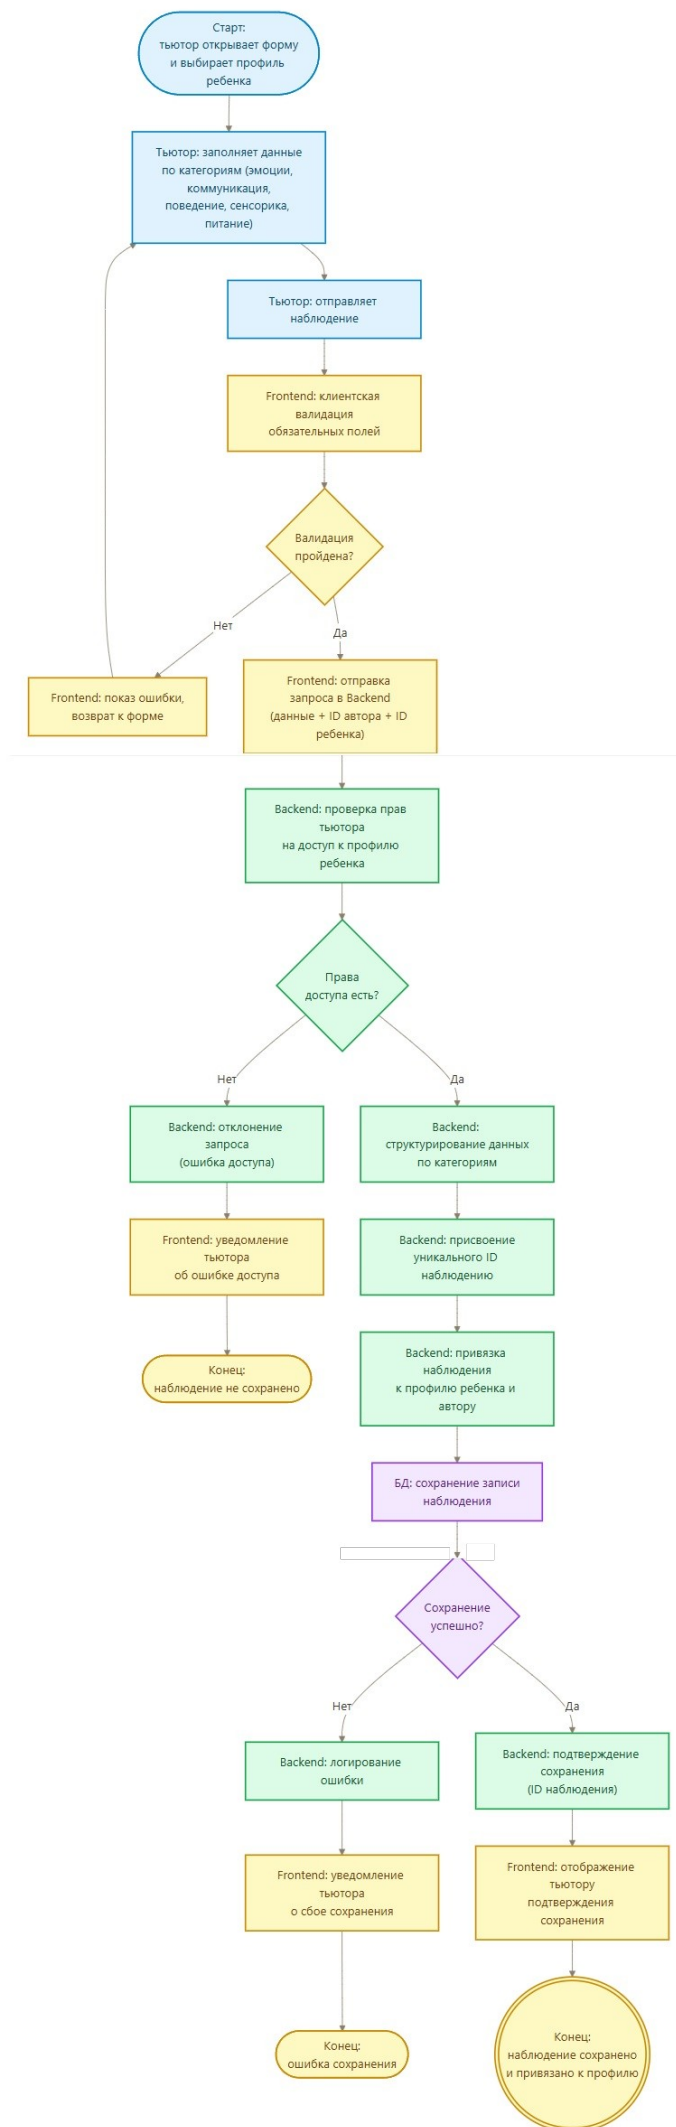

Задача 3: Дорожная карта пилота

Основные вехи:

№	Веха	Срок	Что делаем
M1	Уточнение требований, юридической базы; распределение задач разработки; согласование внешнего вида системы, а также используемых инструментов; уточнение у заказчика ряда дополнительных аспектов; составление и согласование дорожной карты создания MVP	Нед. 1 –2	Консультация СБ, выбор модели доступа, выбор методики фиксации наблюдений, определение группы детей/тьюторов для тестирования (согласование с врачами/специалистами); согласование UI; выбор тех.средств разработки; составление и согласование плана действий. Обсуждение с заказчиком и командой этапов разработки.
M2	Разработка базового функционала (без ИИ); тестирование базового функционала.	Нед. 2 –4	Профиль ребенка, форма наблюдений по категориям, привязка к профилю и автору, связка с БД, базовые роли доступа. Согласование базового функционала и его отображения с заказчиком и СБ. Тестирование работоспособности базового функционала, адаптивность UI на разных типах устройств. При выявлении ошибок — исправление, повторное тестирование. Проверка на соблюдение требований о конфиденциальности.
M3	Подключение AI, тестирование новых функций	Нед. 4 –5	Интеграция LLM (с учетом требований к анонимизации/СБ), генерация первых подсказок на тестовых данных. Тестирование полученных результатов. При нахождении ошибок — исправление, повторное тестирование. Демонстрация заказчику и СБ.
M4	Тестовый запуск на небольшую фокус-группу реальных пользователей (согласованных заказчиком)	Нед. 5 –7	Тьюторы добавляют реальные данные, специалисты и врачи оценивают полезность подсказок в режиме «рекомендация, не решение». Сбор обратной связи о корректности работы/UI. Исправление недочетов. Тестирование. После тестирования — дополнительный сбор обратной связи от фокус-группы.
M5	Оценка результатов и решение о возможном расширении функционала MVP. Финальная обратная связь от заказчика	Нед. 7 –8	Сбор обратной связи, оценка качества AI-подсказок специалистами, отчет владельцу бизнеса, получение обратной связи, предложение о расширении функционала MVP.

Критерии готовности

Веха	Критерий перехода к следующему этапу
M1 → M2	Уточнен юридический аспект возможности использования данных; СБ направила полные требования по конфиденциальности/безопасности данных; Получено согласие для использования данных/наблюдения за тестовой группой; согласована модель доступа (кто что видит); подтверждена структура категорий наблюдений; согласован стэк-технологий; План и стэк-разработки одобрен СБ; Заказчик согласовал сроки разработки, внешний вид программы, методы использования; Определены даты, сроки и способы взаимодействия/связи с заказчиком/командой разработки.
M2 → M3	Разработан бэк и фронт программы; Перед показом заказчику и СБ, бэк и фронт протестирован; Пример показан заказчику и СБ; Внесены необходимые правки, после общения с заказчиком/СБ; Форма наблюдений и сохранение в БД работают; Тьютор может внести наблюдение и увидеть его в профиле ребенка; права доступа соответствуют ролям;
M3 → M4	Используемая LLM одобрена СБ; AI-подсказки генерируются на тестовых данных без критических ошибок; специалист сопровождения/врач подтвердил, что подсказки работают корректно; Доработка AI, бэка, фронта в соответствии с комментариями заказчика; Тестирование.
M4 → M5	Минимум 3–4 недели реального использования; Собрана оценка специалистов и врачей; если зафиксированы случаи ошибок ИИ — внесение исправлений. Обратная связь с заказчиком и другими сотрудниками: комфортно ли им пользоваться программой (удобный ли интерфейс); данные отображаются корректно (бэк); корректны ли AI-подсказки (DS). Выявление недочетов — и последующее исправление.
Финал	Работающее MVP протестированное на реальных данных. Вердикт от заказчика. Возможность развития функционала MVP.

Кто вовлечен:

Роль	Зона ответственности в пилоте
Владелец бизнеса	Заказчик, юр. обоснование возможности создания/использования системы, финальное решение
Тьюторы	Ввод наблюдений, обратная связь по удобству интерфейса / работоспособности программы
Специалисты сопровождения (методисты, психологи)	Валидация структуры категорий наблюдений, оценка качества и полезности AI-подсказок
Врачи	Оценка корректности подсказок с медицинской точки зрения, проверка формата отчетов
Родители	Дают согласие на обработку данных ребенка, оценивают удобство и понятность отчетов
Служба безопасности (СБ)	Оценка рисков разработки: проверка на соблюдение требованиям конфиденциальности, безопасности и т. д. Предоставление доступов.
Команда разработчиков	Разработка бэка/фронта, интеграция LLM, взаимодействие (консультация / обратная связь) с СБ относительно обеспечение доступа и безопасности

Роль	Зона ответственности в пилоте
ВА/РМ	данных Координация, сбор требований, контроль критериев готовности, отчетность

Ключевые риски:

- 1) AI-подсказка окажется неверной или опасной для ребенка с ОВЗ: выход — держать AI строго в режиме «рекомендаций для специалиста», без возможности автоматического применения; должна быть введена обязательная проверка подсказок специалистом перед использованием / рекомендацией; если AI-подсказка оказалась ложной — необходимо зафиксировать это и сообщить о том, что она некорректна, чтобы в последующем исключить ее из возможных гипотез / рекомендаций.
- 2) Некорректное, редкое внесение наблюдений - форма должна быть максимально простой и удобной для пользователя (сокращение отказов в использовании системы/жалоб относительно неудобного интерфейса); можно ввести дополнительную метрику — частота внесения подсказок/обращения к AI.

Выстраивание процесса работы с заказчиком и командой

С заказчиком: связь (любым удобным заказчику способом) в начале рабочей недели (в понедельник) и в конце (пятница). В понедельник — планы команды на рабочую неделю, вопросы относительно изменений в проекте / возможных корректировок, обратная связь от клиента — что нравится / не нравится в проекте, команде и т.д.

В пятницу — краткие результаты работы, на каком этапе находимся, какие есть успехи, если есть проблемы - как мы можем их решить.

С командой (формат видео-конференции): понедельник — обсуждение хода работы, составление плана задач на неделю, обсуждение проблем, поиск вариантов их решения. Пятница — итоги работы, планы на следующую неделю, обсуждение проблем, поиск вариантов их решения.

Отдельный чат в мессенджере для оперативного обсуждения / уведомления / решения проблем.

Обмен телефонами и электронными почтами — для экстренной связи.

2. Мотивация участия в проекте:

- 1) Сфера использования программы: она помогает людям и действительно несет в себе полезный, важный смысл; Также это интересный, дополнительный опыт командной работы; Возможность поработать / изучить / ознакомиться с современными технологиями в разработке; Улучшить себя как аналитика.
- 2) С одной стороны — связь между заказчиком (бизнесом) и командой разработки; с другой — координация работы команды для того чтобы она выполнила свою задачу точно в срок.
- 3) В настоящее время работаю: поэтому, 20 часов в неделю. Желаемый формат — удаленка (привычный для меня, так как работаю в нем уже более 9-ти лет). Если есть возможность/необходимость взаимодействия оффлайн — только гибрид (3-4 дня удаленка и 2-1 офис) и только Москва.

